

# 参 考 資 料



- 事業概要
- 連続立体交差事業の多面的なストック効果
- 計画的、安定的な事業推進の必要性
- 連立関連事業の推進

# 事業概要

## ○事業の概要

都市計画決定	平成 17 年 8 月 23 日
事業認可	平成 20 年 3 月 31 日
事業区間及び延長	区間 清水公園駅～梅郷駅間 延長 2,905m
除却踏切	11箇所
立体交差する道路	16路線うち都市計画道路4路線
駅計画	愛宕駅 相対式ホーム 野田市駅 島式ホーム

## ○事業区間

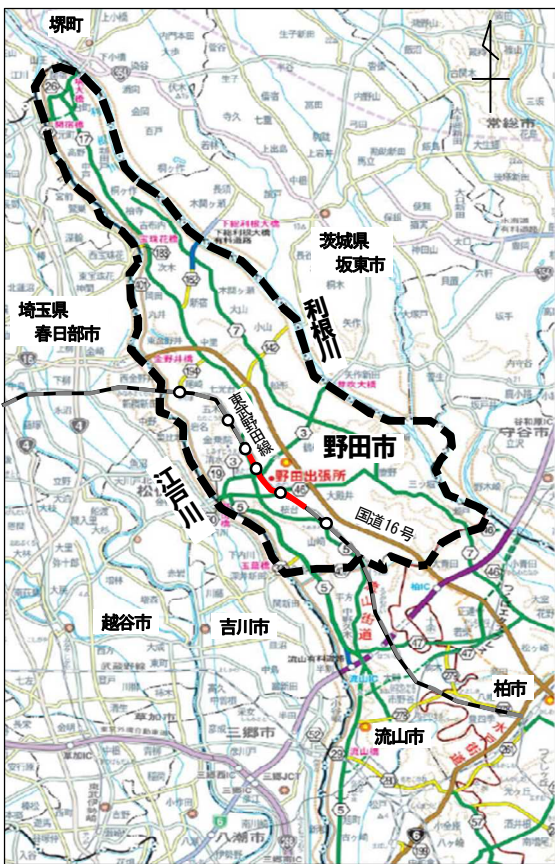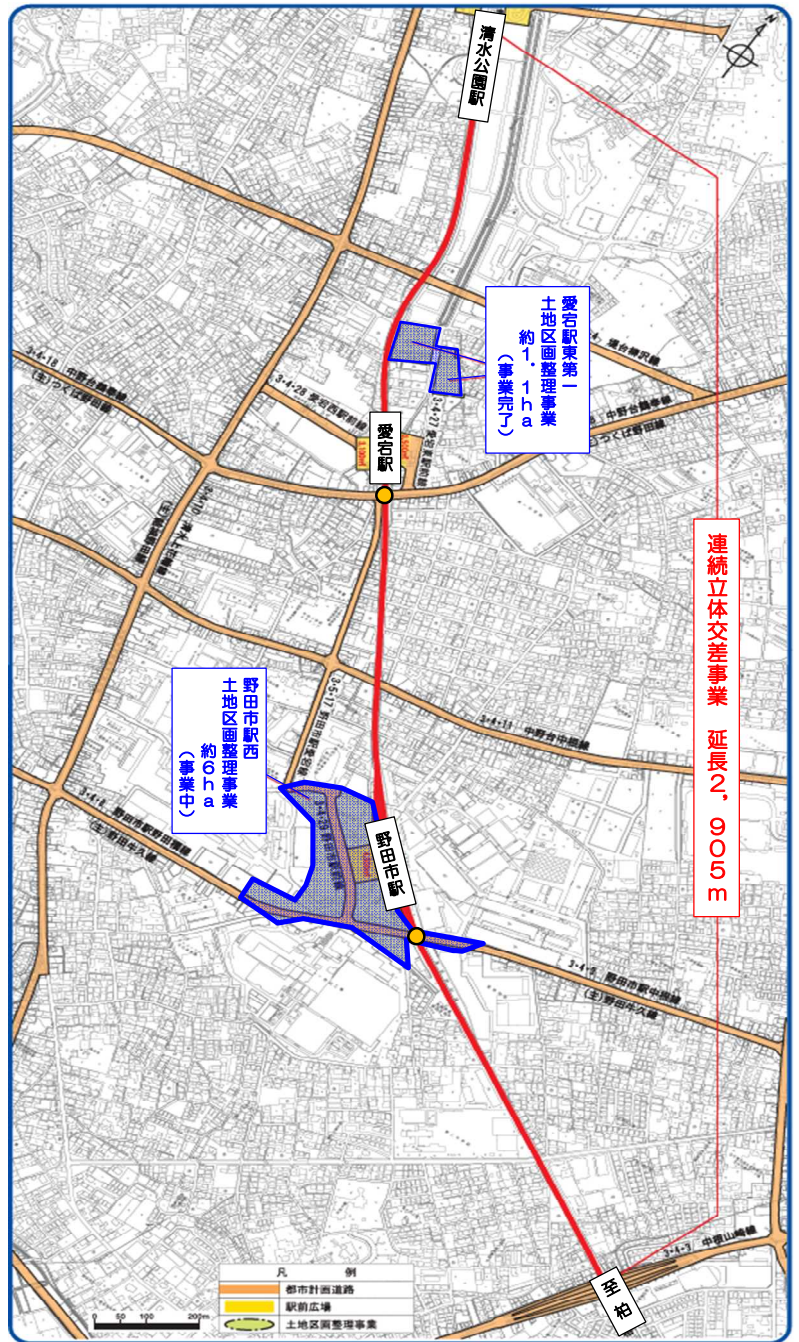

## ○整備前の状況



自動車・歩行者ボトルネック踏切  
(主要地方道つくば野田線)



愛宕駅前踏切の歩道狭小  
(主要地方道つくば野田線)



駅のエレベーター・エスカレーター未整備  
(愛宕駅・野田市駅)

※野田市駅

## 連続立体交差事業の多面的なストック効果

### ・まちの安全

交通渋滞の解消

〔主要地方道 つくば野田線  
主要地方道 野田牛久線〕

踏切事故解消

消防・救急活動の迅速化

### ・まちづくり

街の分断が解消され市街地一体化

〔市道新設4箇所  
踏切除却11箇所〕

### ・移動時間の短縮

〔ボトルネック踏切が解消〕

・都市交通の円滑化と安全性の向上


・総合的なまちづくりの促進

### 踏切交通遮断量

主要地方道	つくば野田線	73,709 (台・時/日)
主要地方道	野田牛久線	51,185 (台・時/日)

(平成30年度交通実態調査(県実施)結果より)

## ◎連続立体交差事業によるストック効果

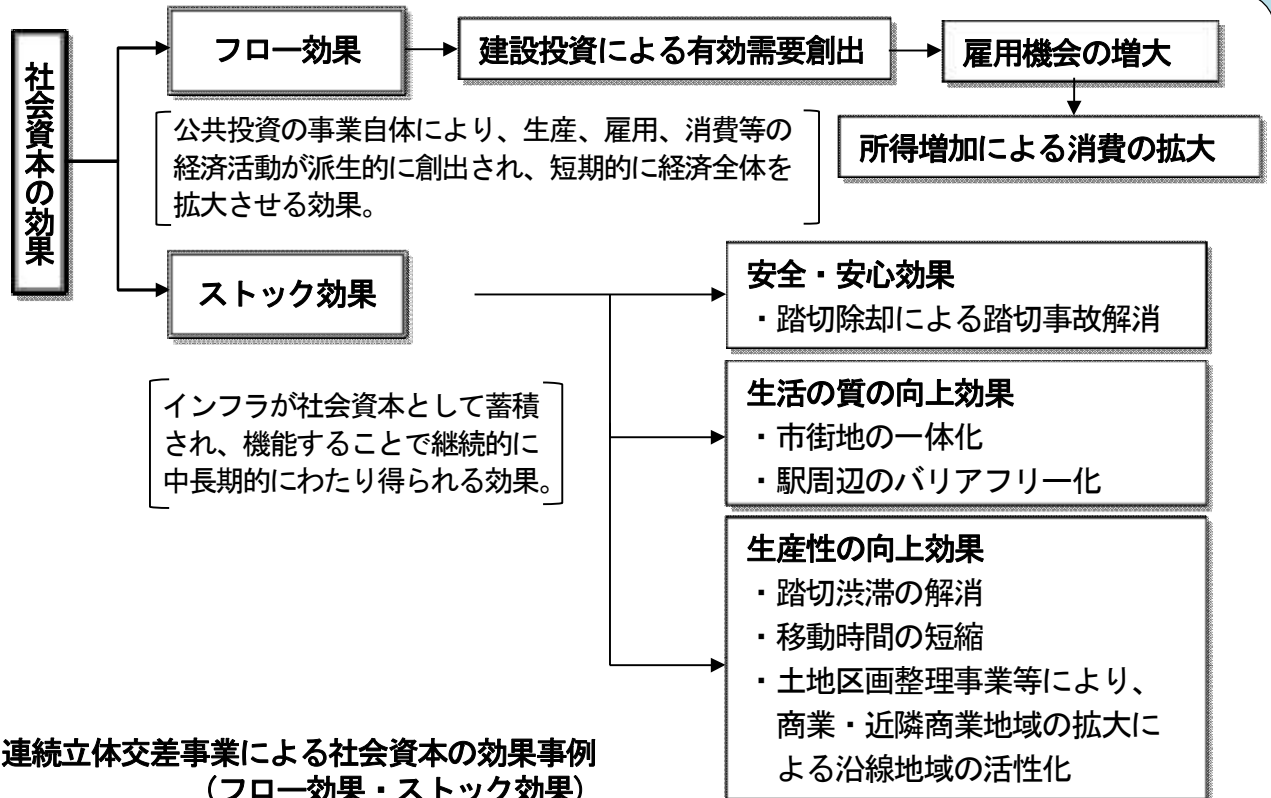

連続立体交差事業による社会資本の効果事例  
(フロー効果・ストック効果)



## 計画的、安定的な事業推進の必要性

### 事業スケジュール

平成 19 年度	都市計画事業認可
平成 22 年度	仮線工事着手
平成 29 年度	全線仮線切替え完了
令和元年度	高架橋及び駅舎工事
令和 2 年度	営業線高架切替え完了 (令和3年3月28日)
令和 3 年度	全線仮線撤去及び駅舎工事
令和 4 年度	高架橋等及び交差道路工事
令和 5 年度	野田市駅舎及び水路復旧工事
令和 6 年度	野田市駅舎工事、トローリー留置線 移設工事、交差道路工事、
令和 8 年度	及び家屋調査補償等

### ● 営業線高架切替え完了



### 踏切の除却



### ● 愛宕駅は仮設通路にて東西から接続可能



### ● 野田市駅は仮駅舎で部分的に供用開始



※エレベーターやエスカレーター等の設置によるバリアフリー化が図られている

● 計画的な事業推進

執行可能な事業費の確保

総事業費 442 億円

事業年度：平成 19 年度～令和 8 年度

事業進捗率：75% (令和 5 年 3 月時点)

※令和 5 年 3 月 17 日認可変更



残事業費 (令和 6～8 年度)

令和 6 年度 約 35.9 億円 (32.4 億円)

令和 7 年度 約 4.4 億円 (4.0 億円)

令和 8 年度 約 2.7 億円 (2.4 億円)

※全体事業費ベース ( ) 内は交付金対象

◎ 市内各駅のバリアフリー化の推進

川間駅 平成 23 年 3 月完了

七光台駅 平成 19 年 2 月完了

清水公園駅 平成 19 年 3 月完了

梅郷駅 平成 19 年 5 月完了

愛宕駅 令和 3 年 3 月完了

野田市駅 令和 3 年 3 月一部暫定形で  
供用開始



近隣駅バリアフリー状況 (東武鉄道HPより)

◎ 踏切除却後に交差道路の整備



◎ 仮線撤去後に水路の復旧整備




◎ 関連事業との整備時期の整合 (愛宕駅)



◎ 関連事業との整備時期の整合 (野田市駅)



# 連立関連事業の推進

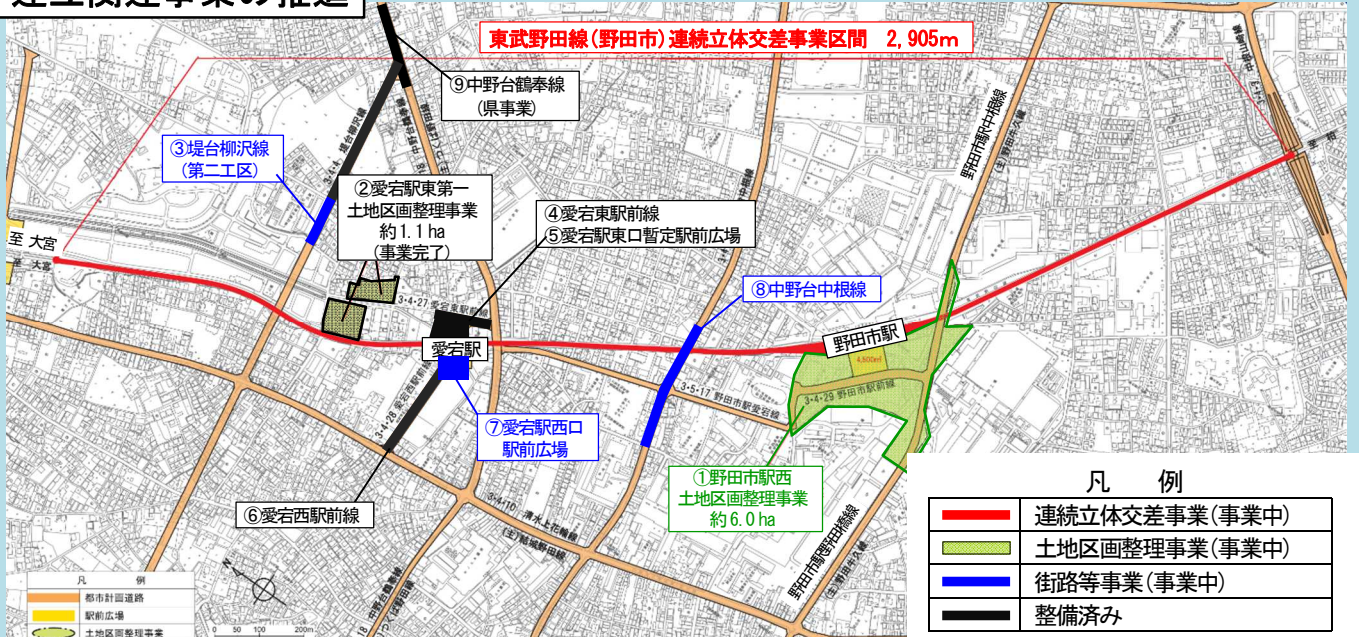

※土地区画整理事業や駅前広場など一体的な整備

## 土地区画整理事業



### 土地区画整理事業

- ①野田市駅西土地区画整理事業 約6.0ha 令和9年度完了予定 市施行
- ②愛宕駅東第一土地区画整理事業 約1.1ha 令和元年度完了 組合施行

### 街路事業等

- ③堤台柳沢線(第二工区) 約110m 令和5年度完了予定 市施行
- ④愛宕東駅前線 約90m 平成27年度完了 市施行
- ⑤愛宕駅東口暫定駅前広場 約3500㎡ 平成27年度完了 市施行
- ⑥愛宕西駅前線 約230m 平成24年度完了 市施行
- ⑦愛宕駅西口駅前広場 約3100㎡ 令和5年度完了予定 市施行
- ⑧中野台中根線 約250m 令和7年度完了予定 市施行
- ⑨中野台鶴奉線 約720m 令和3年度完了 県施行

## 連立関連の街路事業



## 愛宕駅周辺の街路事業

