


## 公共施設等の放射線量測定地図(西亀山青年館)

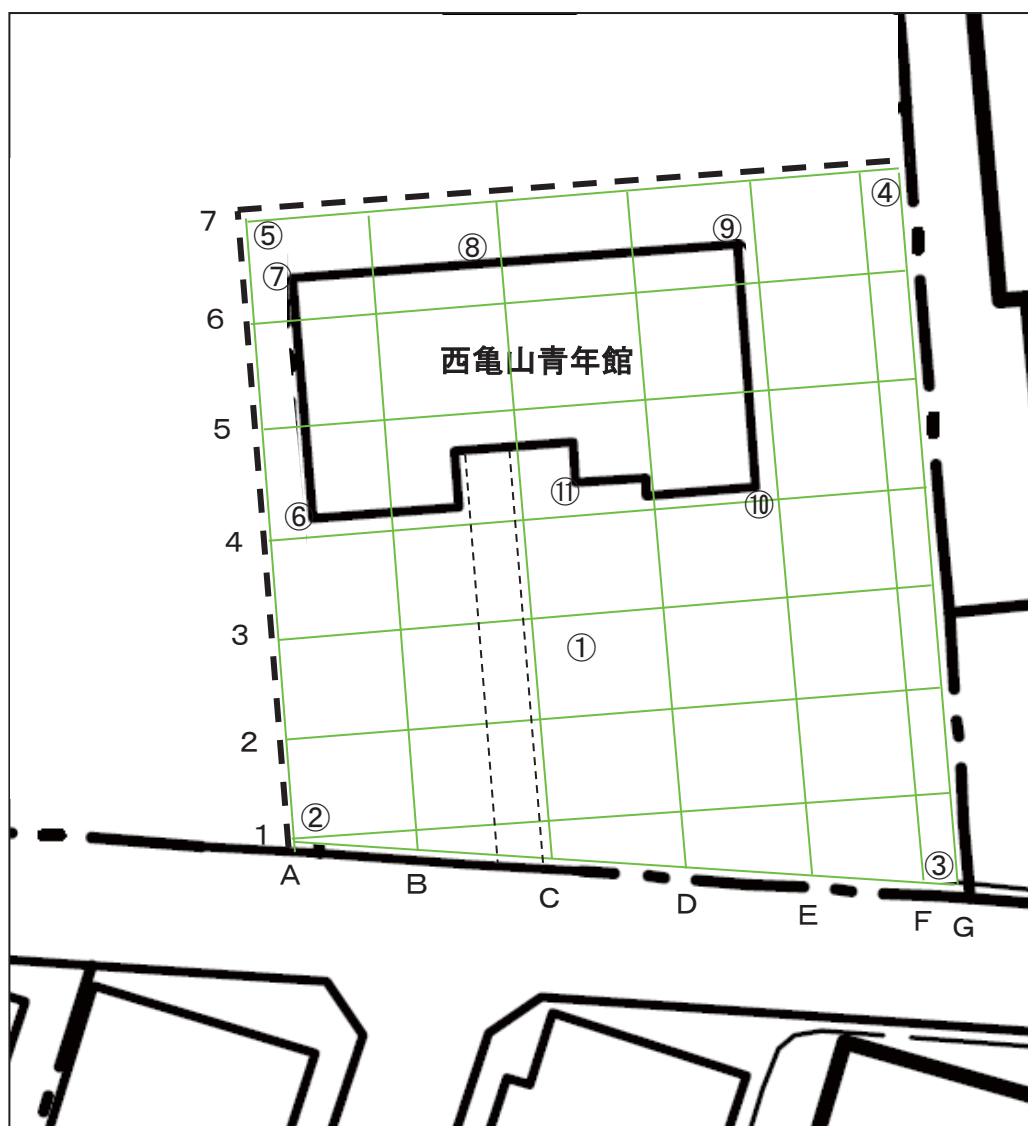

(単位: マイクロシーベルト毎時)

項目		除染前			除染後			除染後		
測定日		平成24年4月11日			平成24年5月1日			平成24年6月21日		
天候		晴			曇り時々雨			曇り		
時間		17時			16時30分			17時		
測点	地面の形状	測定の高さ/測定値			測定の高さ/測定値			測定の高さ/測定値		
		100cm	50cm	5cm	100cm	50cm	5cm	100cm	50cm	5cm
①	土	0.12	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/
②	土	0.18	0.23	0.31	0.13	0.14	0.11	/	/	/
③	土	0.16	0.19	0.29	0.14	0.14	0.13	/	/	/
④	土	0.26	0.32	0.39	0.18	0.21	0.19	/	/	/
⑤	土	0.30	0.41	0.61	0.14	0.18	0.21	/	/	/
雨樋⑥	土	/	/	2.50	/	/	0.14	/	/	/
雨樋⑦	土	/	/	2.02	/	/	0.14	/	/	/
雨樋⑧	コンクリート	/	/	1.23	/	/	0.27	/	/	0.21
雨樋⑨	コンクリート	/	/	0.95	/	/	0.57	/	/	0.34

雨樋⑩	土			0.38			0.17			
雨樋⑪	土			0.53			0.19			
②(A-1)	土	0.18	0.23	0.31	0.13	0.14	0.11			
A-2	土	0.18	0.22	0.24	0.12	0.14	0.16			
A-3	土	0.18	0.23	0.25	0.13	0.13	0.19			
A-4	土	0.22	0.33	0.37	0.13	0.17	0.20			
A-5	土	0.29	0.35	0.35	0.14	0.16	0.12			
A-6	土	0.40	0.59	0.73	0.17	0.21	0.22			
A-7	土	0.28	0.36	0.52	0.14	0.18	0.21			
B-1	土	0.17	0.22	0.30	0.14	0.15	0.14			
B-2	土	0.16	0.19	0.23	0.13	0.15	0.13			
B-3	土	0.14	0.16	0.18						
B-4	土	0.13	0.16	0.18						
B-7	土	0.16	0.19	0.23	0.13	0.13	0.15			
C-1	土	0.13	0.16	0.15						
C-2	土	0.13	0.15	0.15						
C-3	土	0.14	0.15	0.15						
C-4	土	0.15	0.16	0.18						
C-7	土	0.34	0.49	0.63	0.16	0.19	0.14			
D-1	芝	0.19	0.23	0.32	0.15	0.16	0.19			
D-2	土	0.19	0.23	0.32	0.14	0.13	0.11			
D-3	土	0.14	0.17	0.21						
D-4	土	0.18	0.21	0.32	0.14	0.15	0.16			
D-7	土	0.20	0.25	0.29	0.13	0.13	0.12			
E-1	芝	0.18	0.22	0.24	0.15	0.16	0.12			
E-2	芝	0.21	0.26	0.34	0.14	0.18	0.17			
E-3	土	0.15	0.16	0.18						
E-4	土	0.23	0.30	0.44	0.15	0.18	0.17			
E-5	土	0.15	0.17	0.19						
E-6	土	0.21	0.26	0.41	0.15	0.18	0.16			
E-7	土	0.25	0.35	0.61	0.18	0.20	0.13			
F-1	土	0.20	0.22	0.26	0.14	0.18	0.22			
F-2	土	0.18	0.19	0.20						
F-3	土	0.15	0.16	0.22						
F-4	土	0.16	0.16	0.18						
F-5	土	0.16	0.17	0.22						
F-6	土	0.21	0.25	0.27	0.14	0.13	0.09			
F-7	土	0.22	0.27	0.25	0.19	0.22	0.19			
G-1	土	0.15	0.19	0.24	0.14	0.14	0.13			
G-2	土	0.14	0.16	0.21						
G-3	土	0.14	0.15	0.15						
G-4	土	0.15	0.13	0.16						
G-5	土	0.16	0.14	0.17						
G-6	土	0.21	0.22	0.26	0.15	0.17	0.14			
G-7	土	0.17	0.19	0.26	0.18	0.21	0.19			

※⑨の雨どい下の基準超過については、コーンで進入禁止措置としております。
